



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE VERDI DALL'INNESTO SU SR 342 DIR A VIA DE GASPERI IN COMUNE DI MERATE

PRESENTAZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Federico Airoidi – Via C. Baslini n. 10, (23807) Merate (LC)

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Lorenzo Mazzoleni – Via Per Airuno n. 15, (23898) Brivio (LC)

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ramona Lazzaroni – Piazza degli Eroi n. 13, (23807) Merate (LC)

Impresa Appaltatrice: MEZZANZANICA S.p.A. – Via Zanella n. 10, (20015) Parabiago (MI)

ELENCO ANALITICO DELLE OPERE

Fase 1 – Consegna del cantiere ed inizio dei lavori

Fase 2 – Allestimento del cantiere con predisposizione impianti di servizio , durata: 3 (tre) giorni

Fase 3 – Realizzazione Area convivialità «3» con riqualificazione urbana e funzionale dell'area adiacente alla scuola materna, durata 44 (quarantaquattro) giorni

Fase 4 – Realizzazione Intersezione stradale «B» con Via Fratelli Cernuschi e Via Don Cesare Cazzaniga, durata 29 (ventinove) giorni

Fase 5 - Realizzazione Intersezione «A» con Via Statale e Via Ceppo, durata 30 giorni

Fase 6 – Realizzazione opere stradali Lotto I – tra Intersezione «A» e Intersezione «B», durata 50 (cinquanta) giorni

Fase 7 - Realizzazione opere stradali Lotto II – tra Intersezione «B» e Intersezione «C», durata 25 (venticinque) giorni

Fase 8 - Realizzazione Intersezione «C» con via F. Turati e Via Trieste, durata 29 (ventinove) giorni

Fase 9 - Realizzazione Area convivialità 1, riqualificazione urbana area adiacente al civ. 55 ed al civ. 58, durata 29 (ventinove) giorni

Fase 10 – Realizzazione Area convivialità 2, riqualificazione urbana e funzionale aree adiacente civ. 58 ed al civ. 69, durata 20 (venti) giorni

Fase 11 – Piantumazioni e arredo urbano, 24 (ventiquattro) giorni

DURATA COMPLESSIVA DELLE OPERE 283 (DUECENTOOTTANTATRE) GIORNI



Fase 1

Consegna del cantiere ed inizio lavori

- ✓ Durata: 1 giorno (10 Giugno 2022)



Fase 2

Allestimento del cantiere con predisposizione impianti di servizio

- ✓ Durata: 3 giorni (15 Giugno 2022 – 17 Giugno 2022)





Fase 3

Realizzazione Area convivialità «3» con riqualificazione urbana e funzionale dell'area adiacente alla scuola materna

- ✓ Durata: 44 giorni (18 Giugno 2022 – 31 Luglio 2022)
- ✓ Elenco Opere:
 - Rimozione segnaletica stradale;
 - Rimozione recinzioni e ringhiere;
 - Taglio alberi ed estirpazioni delle ceppaie;
 - Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
 - Rimozione pali illuminazione;
 - Formazione di fondazione stradale;
 - Cordoli, zanelle e opere d'arte;
 - Realizzazione di marciapiedi;
 - Pulizia sede stradale;
 - Posa di segnaletica verticale;
 - Realizzazione di segnaletica orizzontale;
 - Formazione di percorsi pedonali.



Fase 4

Realizzazione Intersezione stradale «B» con Via Fratelli Cernuschi e Via Don Cesare Cazzaniga

✓ Durata: 29 giorni (1 Agosto 2022 – 29 Agosto 2022)

✓ Elenco Opere:

- Rimozione segnaletica stradale;
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
- Demolizione di fondazione stradale;
- Asportazione di strato di usura e collegamento;
- Rimozione di guard – rails;
- Rimozione cordoli;
- Rimozione pali illuminazione;
- Formazione di fondazione stradale;
- Formazione di manto di usura e collegamento;
- Cordoli, zanelle e opere d'arte;
- Pulizia sede stradale;
- Posa di segnaletica verticale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale.





Fase 5

Realizzazione Intersezione stradale «A» con Via Statale e Via Ceppo

- ✓ Durata: 30 giorni (1 Agosto 2022 – 30 Agosto 2022)
- ✓ Elenco Opere:
 - Rimozione segnaletica stradale;
 - Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
 - Demolizione di fondazione stradale;
 - Asportazione di strato di usura e collegamento;
 - Rimozione di guard – rails;
 - Rimozione cordoli;
 - Rimozione pali illuminazione;
 - Formazione di fondazione stradale;
 - Formazione di manto di usura e collegamento;
 - Cordoli, zanelle e opere d'arte;
 - Pulizia sede stradale;
 - Posa di segnaletica verticale;
 - Realizzazione di segnaletica orizzontale.



Fase 6

Realizzazione opere stradali Lotto I tra intersezione «A» e Intersezione «B»

✓ Durata: 50 giorni (31 Agosto 2022 - 19 Ottobre 2022)

✓ Elenco Opere:

- Rimozione segnaletica stradale;
- Rimozione recinzioni e ringhiere;
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
- Demolizione di fondazione stradale;
- Rimozione cordoli;
- Asportazione di strato d'usura e collegamento;
- Disfacimento di pavimentazione in autobloccanti – pietre;
- Rimozione pali illuminazione;
- Posa di cavidotto;
- Formazione di fondazione stradale;
- Cordoli, zanelle e opere d'arte
- Realizzazione di marciapiedi
- Pulizia sede stradale;
- Posa di segnaletica verticale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale;
- Formazione di percorsi pedonali;



Fase 7

Realizzazione opere stradali Lotto II tra intersezione «B» e Intersezione «C»


✓ Durata: 25 giorni (20 Ottobre 2022 – 13 Novembre 2022)

✓ Elenco Opere:

- Rimozione segnaletica stradale;
- Rimozione recinzioni e ringhiere;
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
- Demolizione di fondazione stradale;
- Rimozione cordoli;
- Asportazione di strato d'usura e collegamento;
- Disfacimento di pavimentazione in autobloccanti – pietre;
- Rimozione pali illuminazione;
- Posa di cavidotto;
- Formazione di fondazione stradale;
- Cordoli, zanelle e opere d'arte
- Realizzazione di marciapiedi
- Pulizia sede stradale;
- Posa di segnaletica verticale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale;
- Formazione di percorsi pedonali;

Fase 8

Realizzazione Intersezione stradale «C» con Via F. Turati e Via Trieste

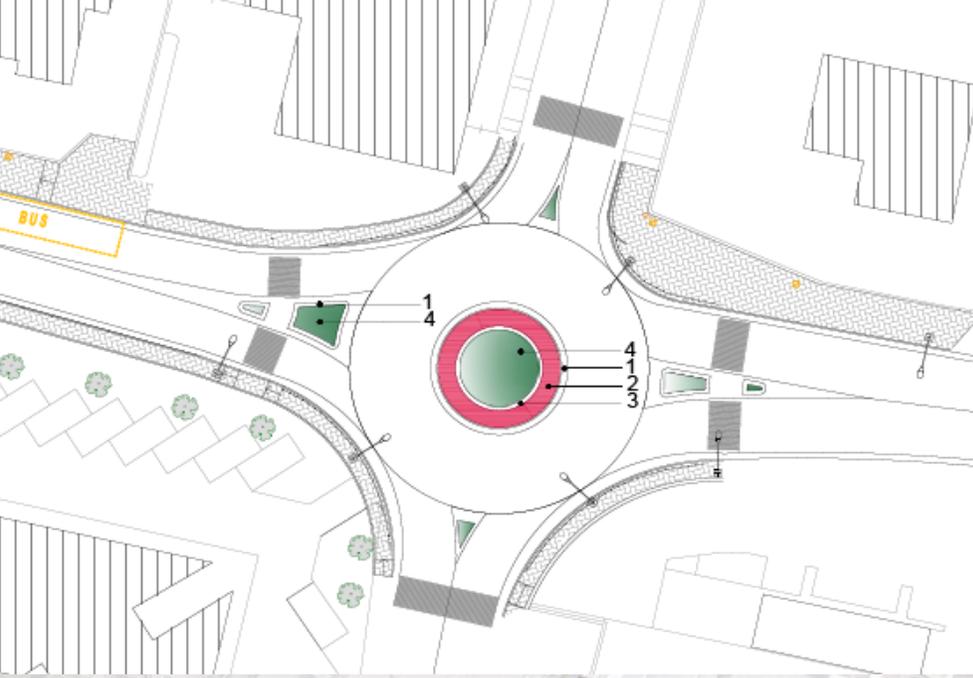

✓ Durata: 29 giorni (14 Novembre 2022 – 13 Dicembre 2022)

✓ Elenco Opere:

- Rimozione segnaletica stradale;
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
- Demolizione di fondazione stradale;
- Asportazione di strato di usura e collegamento;
- Rimozione di guard – rails;
- Rimozione cordoli;
- Rimozione pali illuminazione;
- Formazione di fondazione stradale;
- Formazione di manto di usura e collegamento;
- Cordoli, zanelle e opere d'arte;
- Pulizia sede stradale;
- Posa di segnaletica verticale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale.





Fase 9

Realizzazione area di convivialità 1, riqualificazione urbana area adiacente al civ. 55 ed al civ. 58

✓ Durata: 29 giorni (14 Dicembre 2022 – 11 Gennaio 2023)

✓ Elenco Opere:

- Rimozione segnaletica stradale;
- Demolizione di fondazione stradale;
- Rimozione cordoli;
- Rimozione pali illuminazione;
- Formazione di fondazione stradale;
- Cordoli, zanelle e opere d'arte;
- Realizzazione di marciapiedi;
- Posa di pavimenti per esterni in pietra;
- Realizzazioni della carpenteria per le strutture in elevazione
- Pulizia sede stradale;
- Posa di segnaletica verticale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale;
- Formazione di percorsi pedonali;



Fase 10

Realizzazione area di convivialità 2, riqualificazione urbana e funzionale area adiacente al civ. 58 ed al civ. 69

✓ Durata: 20 giorni (12 Gennaio 2023 – 31 Gennaio 2023)

✓ Elenco Opere:

- Rimozione segnaletica stradale;
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
- Demolizione di fondazione stradale;
- Rimozione cordoli;
- Rimozione pali illuminazione;
- Formazione di fondazione stradale;
- Cordoli, zanelle e opere d'arte;
- Realizzazione di marciapiedi;
- Posa di pavimenti per esterni in pietra;
- Pulizia sede stradale;
- Posa di segnaletica verticale;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale;
- Formazione di percorsi pedonali;
- Installazione casetta dell'acqua.



Fase 11

Piantumazione e arredo urbano

✓ Durata: 24 giorni (1 Febbraio 2023 – 24 Febbraio 2023)

✓ Elenco Opere:

- Installazione arredo urbano;
- Installazione dissuasori di traffico;
- Installazione tavoli da picnic
- Installazione pensiline
- Posa di panchine, cestini, fontanelle, fioriere;
- Installazione di portabiciclette;
- Piantumazione e posa superfici verdi;
- Messa a dimora di piante.

Pulizia e finiture

✓ Durata: 25 Febbraio 2023 – 18 Marzo 2023

